



“畅通郑州” 未来路 中原西路线 266条支线

陇海快速路地面工程

10月份全面完工

陇海快速路工程地面快车道 40条匝道建成投用36条,地面道路快车道大部分通车,通行总长26公里,正在进行非机动车道和人行道铺装施工;陇海路BRT工程桥下站台施工正在紧张进行,地面道路工程计划于10月份全面完工。

农业快速路工程 今年3月开工建设,目前桩基完成62.8%,预计2016年春节前南阳路以东高架主线可以实现贯通。

中州大道南延工程(陇海铁路—京广铁路)段 航海路至南三

环段已完工通车,全线计划2016年4月底前建成通车。

京广快速路北延工程 除铁路代建段和惠济收费站改扩建工程外,主线桥和道路已具备通车条件;北延工程力争年底前全部完工;南延工程,目前高架桥部分桩基完成96.2%,力争年底前建成通车。

四环快速路工程 快速化方案已编制完成,其中先期实施的南四环快速化(嵩山路至十八里河桥段)工程计划年底前高架部分完工,2016年6月底全部完工。

轨道交通5号线

已有15座车站开建

地铁2号线一期工程 16座车站主体结构已完工,风亭、出入口附属结构施工近半,铺轨完成工程量的47%,计划年底实现全线洞通,基本完成机电安装、风水电及装饰装修,满足综合联调联试条件。其中,航海东路站已还路,向阳路站8月底前还路,南环路站以及新龙路站、国基路站、北环路站、农业路站、东大街站、帆布厂街站部分出入口9月份实现还路。南四环至郑州南站城郊铁路工程一期计划年底前实现高架车站完工、全线洞通。

地铁1号线二期 10座车站已实现3座车站主体结构封顶;全线隧道已进入全面盾构掘进阶段,计划年底前实现所有车站主体结构完工、洞通,附属结构施工完成50%,轨道安装完成20%。

地铁5号线 32座车站已实现15座车站开工建设,2座车站正在进行主体结构施工,计划年底实现全线90%的车站开工。

地铁3号线一期 计划年底开工。

地铁4号线 正在开展勘察设计工作,计划2016年开工建设。


陇海快速路地面工程10月份全面完工、农业快速路工程南阳路以东高架主线春节前可实现贯通、地铁5号线已有15座车站开建、中原西路线有轨电车年底开建……昨日上午,市十四届人大常委会第十一次会议听取了副市长张俊峰代表市政府作的关于“畅通郑州”工程进展情况的报告,各项工程建设取得了阶段性成果,公交都市建设步伐加快。
郑州晚报记者 袁帅/文 马健 周甬/图



三环快速化工程



地铁1号线大大缓解市区中心东西方向主干道交通压力

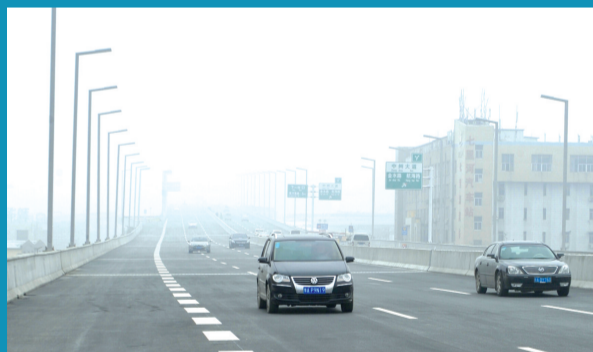

陇海路高架未来路段



黄河路下穿铁路涵洞

107辅道快速化工程

11月份开工建设

三环快速化工程是“畅通郑州”最重要的组成部分,目前各项工程都已进入收尾阶段。

南三环东延工程 一期(紫寰路—南台路)工程市政段8月底主线桥完工,10月底地面道路工程完工;跨京广铁路铁路代建段完成总产值的20.5%,计划年底建成;二期(南台路—107辅道)工程力争2016年底全部完工。

北三环东延快速通道工程 正在编制可研报告、勘察设计招

标及环评、安评等工作。北三环东延与京港澳高速互通式立交新建工程,计划12月开工。

107辅道快速化工程(连霍高速—南四环)工程 立项、环评、土地预审已获批,PPP方案已确定,近期拟进行招投标,计划11月份开工建设。

西三环下穿陇海铁路隧道工程 西站路箱桥已完成,挡土墙完成58%,U形槽完成33%,累计完成产值1.77亿元,占总产值的80%。

“米”字高铁

正在加紧推进建设

“米”字形高铁是加强郑州区位优势的重要举措,目前各项工作都在加紧推进中。

郑徐高铁 建设进展顺利,计划明年6月开通运营。

郑万铁路 可研要件报批工作已基本完成,应急工程征迁工作

正在推进。

郑合铁路 可研要件报批工作正在进行。

郑焦城际铁路 已于6月28日开通运营。

郑州至机场城际铁路 已完成交地98%,计划今年底开通运营。

266条支线路网

年底前全部具备通车条件

市区内的主干道准快速化、市域快速通道以及支线路网也都在加紧建设中。

金水路准快速化工程 未来路下穿金水路隧道主体结构已完成,预计10月1日可建成通车;经三路—城东路下穿金水路隧道主体结构已完成90%,主隧道9月10日前贯通,10月底全面完工;金水路西延工程房屋征迁、管线改迁已完成,计划2016年底建成通车。

紫荆山准快速化工程 市区段方案正在编制,南延工程正在推进,郑航北路—南三环段正在进行污水、电力土建和快车道施工,宇通路—环翠路、渠南路—南四环段道路工程基本完成,下穿高铁代建合同已签订,正在办相关手续,9月初进场施工。

市域快速通道工程 已建成通车市域快速通道9条,共202.5公里;在建市域快速通道2条,中原路西延快速通道(上街—鞏义S237段)、G107辅道南延快速通道(南四环至西南绕城高速段)计划年底前完工。

266条支线路网工程 已全部开工,其中完工198条,完工率74.4%,68条正在建设,计划年底前全部具备通车条件。

养老度假天堂 山东·龙口

★电话:0371-69350859

周末 看大海 吃海鲜 坐游艇
走起 泡温泉 洗海藻

一线海景房温泉入户 3500元/m²

98元三天两夜夫妻实地看房游

燃气客服系统“升级”不影响用户正常用气
8月29日—9月1日暂停缴费

为提升用户信息化管理水平,向用户提供更加优质的服务,郑州华润燃气公司将于8月29日18:00—9月2日8:00对现有客服系统进行全面升级,升级期间用户缴费会受到暂时影响,但不影响居民正常用气和车用气加气业务。

具体需要暂停的业务详情如下:

1、8月30日—9月1日(3天),停止抄表用户的气费缴纳;
2、9月1日,暂停IC卡用户的充值业务(包括银行、第三方支付机构如利安超市、博雅之道、全民付的代收业务);

3、9月2日后交通银行和建设银行的非代扣用户缴费会受到影响,大家可选择其他银行进行缴费。

业务暂停期间,公司将继续做好日常维修、抢修、客户安检等上门服务。如果您需要缴纳燃气费用,请注意时间安排,避开暂停收费时间段,IC卡用户请查看卡内余额,余额不足的请提前做好充值准备,由于系统升级给您带来的不便,我们表示诚挚的歉意。郑州华润燃气公司感谢您的理解和支持,如果您有任何问题和疑问,请拨打24小时燃气热线:0371-68855777。
